


Am Thomasweg Liebefeld, Köniz
Geplante Etappierung

Diese Grafiken bilden Stand Dezember 2017 die vorgesehene Etappierung der Neuüberbauung ab. Je nach weiterem Verlauf der Projektentwicklung (u. a. Planerlassverfahren, Baubewilligungsverfahren, Marktentwicklung etc.) bleiben Anpassungen ausdrücklich vorbehalten.

Etappe 1

Baubeginn frühestens Anfang 2020

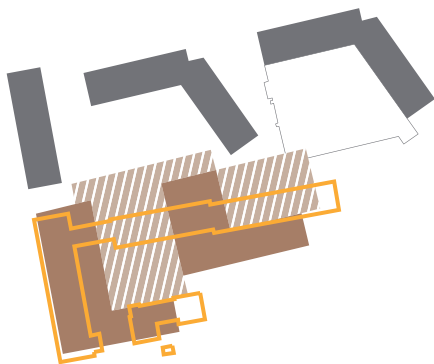


In der ersten Etappe werden die zwei Neubauten an der Stationstrasse mit der ersten Hälfte der neuen Einstellhalle erstellt (Rückbau Stationstrasse 42, 44, 46 und Könizstrasse 217, 219, 221, 223, 225). Die bestehende Einstellhalle sowie die restlichen Gebäude bleiben vorläufig unberührt bestehen.

WG Neubau	91
WG Altbau	94
WG Total	185
WG Rückbau	48

Etappe 2

Baubeginn frühestens ca. 2022

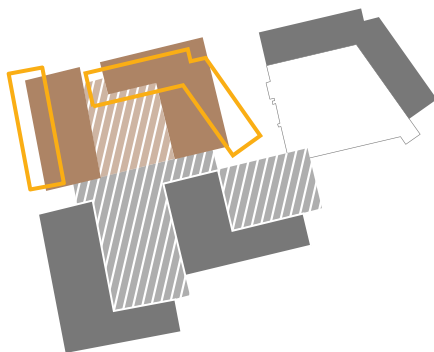


In der zweiten Etappe werden die zwei Neubauten am Thomasweg mit der zweiten Hälfte der neuen Einstellhalle erstellt (Rückbau Thomasweg 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29). Die bestehende Einstellhalle sowie die Gebäude am Thomasweg 3, 5, 7, 9 und 11 bleiben vorläufig bestehen.

WG Neubau	81
WG Altbau	38
WG Total	210
WG Rückbau	56

Etappe 3

Baubeginn frühestens ca. 2024

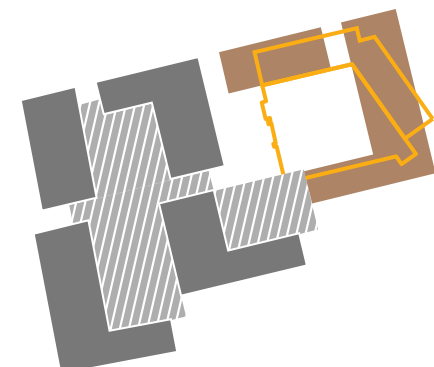

In der dritten Etappe werden die verbliebenen Gebäude am Thomasweg 3, 5, 7, 9 und 11 sowie die bestehende Einstellhalle durch Neubauten ersetzt.

WG Neubau	104
WG Altbau	0
WG Total	276
WG Rückbau	38
